

下水道工事だより (第1号)

工事名：豊平川処理区水車町4丁目ほか下水道新設工事


発行日 令和元年11月1日

大善建設株式会社

・水車町4丁目ほか下水道新設工事（水車町4丁目・平岸3条8丁目・平岸6条9丁目・美園3条6丁目）4箇所において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解を申し上げます。

去る10月上旬に対象箇所である4箇所の工事前の『事前調査』を実施いたしました。調査の結果をもとに下記の図のとおり道路部分を掘らずに地震に強い下水道管にするため本工事を11月中旬より実施する予定です。 **4箇所とも夜間での作業となります。**

本工事の施工日が決定いたしましたら、再度近隣地区には前回同様『工事のおしらせ』を配布いたしますので宜しくお願い致します。

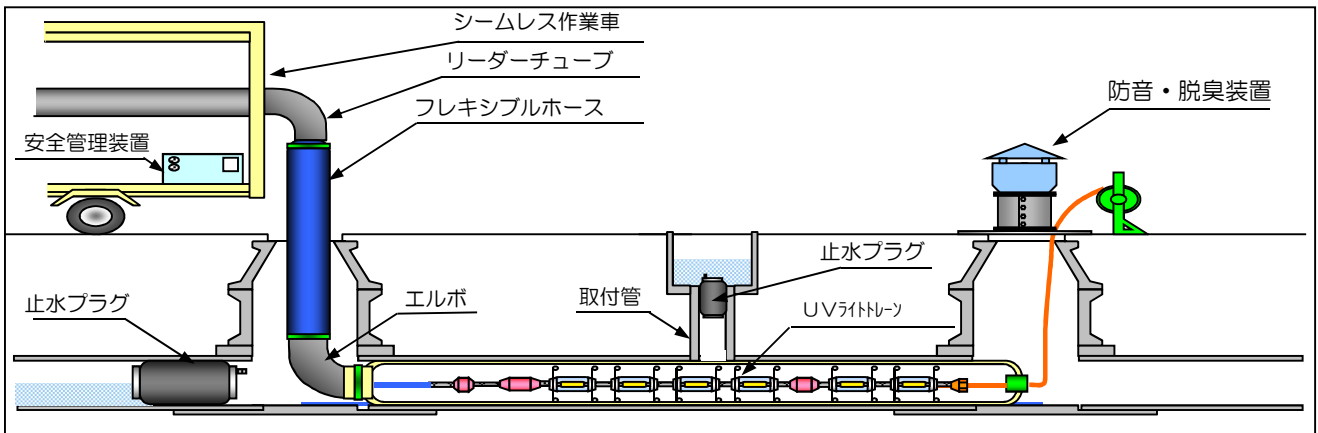

本工事の進捗状況


先月（令和元年10月度）の主な実施内容

- ・事前調査を実施しました。
- ・事前調査の結果をもとに下水道管の中で使用する材料を発注しました。

今月（令和元年11月度）の予定

- ・11月中旬（予定）より下水道管の工事を開始致します。
- ・本施工前に地域貢献の一環として近隣の道路清掃を実施する予定です。

工事進捗グラフ（10月末現在） 15%



工事完了!!

下水道工事だより (第2号 速報)

工事名：豊平川処理区水車町4丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和元年11月21日

大善建設株式会社

・水車町4丁目ほか下水道新設工事（水車町4丁目・平岸3条8丁目・平岸6条9丁目・美園3条6丁目）4箇所において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解を申し上げます。

第1号の下水道工事だよりでお知らせしました、本工事を11月28日（木）より実施いたします。下記の日程で作業致しますのでご理解・ご協力お願い申し上げます。

- ☆ 11月28日（木）路線番号④ 美園3条6丁目 21：00～ 予備日 11月29日、12月1日
- ☆ 11月29日（金）路線番号① 水車町4丁目 21：00～ 予備日 12月1・2日
- ☆ 12月 2日（火）路線番号② 平岸3条8丁目 21：00～ 予備日 12月3・4日
- ☆ 12月 5日（木）路線番号③ 平岸6条9丁目 21：00～)

12月 5日から作業開始の平岸6条9丁目は概ね2週間程度の工事期間を要しますが、その他の工事区間は通常作業1日間で完了します。 **4箇所とも夜間での作業となります。**

本工事の進捗状況

今月（令和元年11月度）の主な実施内容

- ・本施工前に地域貢献の一環として近隣の道路清掃を実施いたしました。
- ・工事で使用する材料が納品され、材料がきちんと適合しているかの検査を実施しました。

来月（令和元年12月度）の予定

- ・予定どおりいけば、路線①と④は完了しており、残りの②と④の工事をおこないます。
- ・地域貢献の一環として近隣のゴミ拾いを実施する予定です。



水車町4丁目付近での歩道清掃作業実施




平岸3条8丁目付近での歩道清掃作業実施



工事で使用する材料の適合検査

工事進捗グラフ（11月21日現在） 30%



下水道工事だより

(第3号)

工事名：豊平川処理区水車町4丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和元年12月2日

大善建設株式会社

・水車町4丁目ほか下水道新設工事（平岸3条8丁目・平岸6条9丁目）残2箇所においても早期完成を目指し、工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解を申し上げます。

皆様のご協力により11月28日と29日に予定していた美園3条6丁目と水車町4丁目の作業は完了致しました。また、残りの2箇所についても下記の日程で作業致しますのでご理解・ご協力お願い申し上げます。

☆ 12月 2日（火）路線番号② 平岸3条8丁目 21：00～ 予備日 12月3・4日）

☆ 12月 5日（木）路線番号③ 平岸6条9丁目 21：00～ ）

12月 5日から作業開始の平岸6条9丁目は概ね2週間程度の工事期間を要しますが、平岸3条8丁目 路線番号②は1日間で完了します。 **2箇所とも夜間での作業となります。**

本工事の進捗状況

先月（令和元年11月度）の主な実施内容

- ・本施工前に地域貢献の一環として近隣の道路清掃を実施いたしました。
- ・工事で使用する材料が納品され、材料がきちんと適合しているかの検査を実施しました。
- ・水車町4丁目・美園3条6丁目の本工事を実施しました。

今月（令和元年12月度）の予定

- ・平岸3条8丁目・平岸6条9丁目の工事をおこないます。
- ・地域貢献の一環として近隣のゴミ拾いを実施する予定です。



作業状況（UVライト挿入）




UVライト点灯確認



社内安全パトロール

工事進捗グラフ（11月30日現在） 40%



工事完了!!

下水道工事だより

(第4号 終刊)

工事名：豊平川処理区水車町4丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和元年12月17日

大善建設株式会社

- ・10月初旬より実施していた水車町4丁目ほか下水道新設工事は、皆様のおかげをもちまして12月17日に工事が完成いたしました。
- ・残工事として現場作業で実施して工事の書類整理を残すだけとなりました！
- ・皆様のご協力によりスムーズな施工、事故や苦情ももなく工事完成できたことに感謝いたします。
- ・また第1号から発行してきた水車町4丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は、現場作業が完了したことから本4号をもって終わらせて頂きます。まことにありがとうございました。

本工事の進捗状況

今月（令和元年12月度）の主な実施内容

- ・平岸3条8丁目・平岸6条9丁目の工事をおこないました。
- ・地域貢献の一環として近隣のゴミ拾いを実施いたしました。



SPR施工写真




製管状況



平岸6条9丁目付近での歩道清掃作業実施

工事進捗グラフ（12月17日現在） 100%



工事完了!!

残すは書類整理のみです!!

【現場代理人よりコメント】

地域の皆様のご理解とご協力により、10月から始まった現場作業もおかげ様で100%完了しました。夜間工事の作業であり、振動や騒音には十分気を使って施工いたしました。騒音など、ご迷惑をお掛けしたかもしれません。皆さまのおかげで苦情等なく早期完成と無事故で現場作業が終了することが出来ました。ここに改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
