

下水道工事だより (第1号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 8月 1日

大善建設株式会社

日頃より下水道工事にご協力・ご理解を頂きお礼申し上げます。この度、当社で古い下水道管をリニューアルする工事を行う事となりましたのでお知らせします。古い下水道管(主に昭和51年施工)を管更生工法により新しい下水道管にする工事です。工事期間中は、近隣の皆様方にはご不便とご迷惑をお掛けすることがあると思いますが、「安全を第一」に心掛け、早期に完成するように致しますので地域住民の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、安全第一で施工しますが、工事箇所付近は工事車両等で危険ですので、十分に注意して下さいようお願い致します。工事につきまして不明な事がございましたら、下記の現場責任者までご連絡下さい。

1 工事概要

工事名	豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事
工期	令和2年7月20日～令和3年1月15日
工事場所	札幌市豊平区西岡地区ほか
工事内容	既設下水道管の更生工事 (道路を掘ったりする工事ではありません)
工事予定期間	8月下旬～9月下旬 (調査) 11月上旬～12月中旬 (管更生工事)
請負者	大善建設株式会社 TEL213-9645
作業時間帯	土・日・祝は作業をしません 平日 9:00～17:00 (予定) 平日 21:00～6:00 (豊平区西岡2・4・5条14丁目) (予定)
交通規制	片側交互通行及び一部車両交通止め

2 工事箇所

- 豊平区西岡2・4・5条14丁目
- 豊平区平岸2条16丁目
- 豊平区中の島2条10丁目
- 豊平区中の島2条8丁目

3 管更生工法

管更生(パルムSZ工法)はSZライク-を管渠内に引込み、空気圧により管内面に圧着し、蒸気で加熱硬化させて、既設下水道管内に新しい強靱なFRP管を形成する工法です。

下水道工事だより (第2号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 9月 1日

大善建設株式会社

・豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解・ご協力を申し上げます。またご不明な点やご質問等ございましたら遠慮なくお問い合わせ願います。

8月下旬より施工箇所の『事前調査』を順次実施いたしております。

この『事前調査』の結果をもとに、道路部分を掘らずに地震に強い下水道管にするための本工事を11月上旬より実施する予定です。（近くなりましたら再度ご案内いたします）

交通量の多い箇所は夜間で作業を行う等しておりますが、一次的に自宅前等で施工に伴う作業車が駐車し大変ご迷惑をおかけしますが、工事早期完了のため重ねてご協力のほどお願い申し上げます。

作業の様子



本工事の進捗状況


先月（令和2年8月度）の主な実施内容

- ・域住民様へ「下水道工事のお知らせ」の配布を行いました。

今月（令和2年9月度）の予定

- ・現在の下水道管の現状を調べるため『事前調査』を実施します。

工事進捗グラフ（8月末現在） 15%



下水道工事だより (第3号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 10月 1日

大善建設株式会社

・豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解・ご協力を申し上げます。またご不明な点やご質問等ございましたら遠慮なくお問い合わせ願います。

地震に強い下水道管にする為に、9月の下旬より工事に障害のある物を除去する『事前処理作業』を行います。マンホールを開ける為、一次的に自宅前等に施工に伴う作業車が駐車し、大変ご迷惑をおかけする場合があります。工事早期完了のため、重ねてご協力のほどお願い申し上げます。本工事は11月から実施する予定です。（近くなりましたら再度ご案内いたします）

ボランティア清掃を行いました



事前処理作業の様子



本工事の進捗状況


先月（令和2年9月度）の主な実施内容

- ・現在の下水道管の現状を調べるため『事前調査』を実施しました。
- ・近隣の公園のボランティア清掃を行いました。

今月（令和2年10月度）の予定

- ・『事前調査』で得たデータをもとに管内に布設する材料を発注します。
- ・本工事（管更生）前の『事前処理作業』を実施する予定です。
- ・材料納品後に『本工事（管更生）』の作業を開始する予定です。

工事進捗グラフ（9月末現在） 40%



下水道工事だより (第4号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 11月 1日

大善建設株式会社


・豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解・ご協力を申し上げます。またご不明な点やご質問等ございましたら遠慮なくお問い合わせ願います。

10月の下旬より下水道管工事に障害のある物を除去する『事前処理作業』い、11月上旬から本工事（下水道管のリニューアル）を行います。

周辺地域様には『下水道工事のお知らせ』を順次配布致しております。

一次的に自宅前等に施工に伴う作業車が駐車し、大変ご迷惑をおかけする場合がありますが、工事早期完了のため、重ねてご協力のほどお願い申し上げます。

***** 作業中の様子 *****

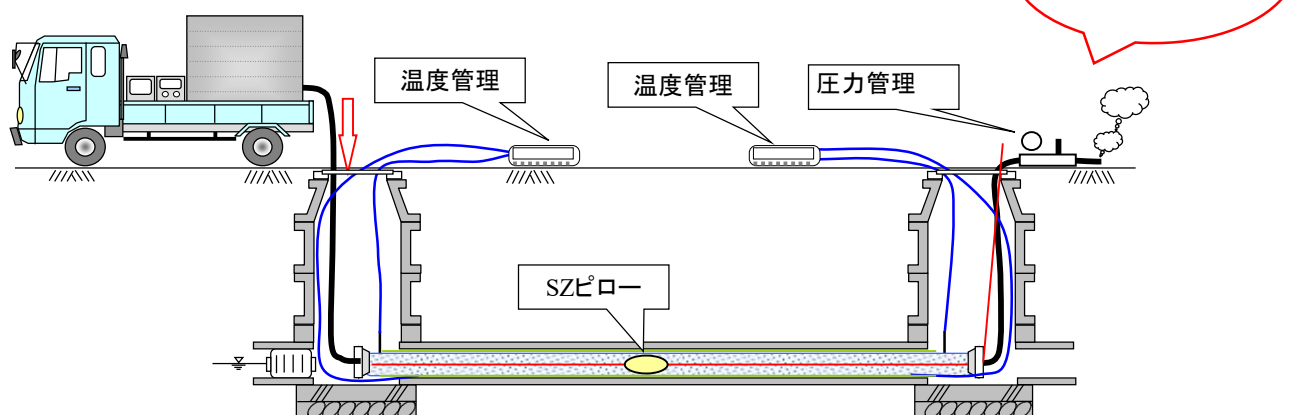

本工事の進捗状況


先月（令和2年10月度）の主な実施内容

- ・現在の下水道管の現状を調べるため『事前調査』を実施しました。
- ・『事前調査』で得たデータをもとに管内に布設する材料を発注します。

今月（令和2年11月度）の予定

- ・11月上旬より下水道管の工事を順次開始します。

工事進捗グラフ（10月末現在） 50%



下水道工事だより (第5号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 12月 1日

大善建設株式会社

・豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事において、近隣住民様方と工事の早期完成を目指し、地域一体となり工事を進めてまいりますので、工事に関するご理解・ご協力を申し上げます。またご不明な点やご質問等ございましたら遠慮なくお問い合わせ願います。

11月上旬より本工事（下水道管のリニューアル）が進み、事故もなく作業を進めております。施工方法の特性上、蒸気を発する工事ですが問題はありませんのでご安心ください。一次的に自宅前等に施工に伴う作業車が駐車し、大変ご迷惑をおかけする場合がありますが、工事早期完了のため、重ねてご協力のほどお願い申し上げます。

***** 作業中の様子 *****



下水道管の材料を搬入中



下水道管をリニューアル
工事の様子

本工事の進捗状況


先月（令和2年11月度）の主な実施内容

- ・11月上旬より下水道管の工事を順次開始しています。

今月（令和2年12月度）の予定

- ・12月で工事が全て完成予定です。

工事進捗グラフ（11月末現在） 90%



下水道工事だより (第6号)

工事名：豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事

発行日 令和 2年 12月 末日

大善建設株式会社


- ・11月より実施していた豊平川処理区西岡2条14丁目ほか下水道新設工事は、皆様のおかげをもちまして12月18日に現場での工事がすべて完成いたしました。事故もなく工事完成できたことに感謝いたします。当現場での作業中に騒音等で何かとご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げますと共に、片側通行による迂回にもご協力いただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
- ・8月より第1号を発行してまいりました『下水道工事だより』は、現場作業が完了したことから本6号をもって終わらせて頂きます。まことにありがとうございました。

***** 最終仕上げの様子 *****



下水道管を新しく形成後
出入り口の仕上げ作業を行い
工事は終了です

工事進捗グラフ (12月末現在) 100%



大善建設株式会社 現場代理人 荒井 修一 (アライ シュウイチ) TEL 080-5838-8282
